



**OBČINA TREBNJE
ŽUPAN**

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 671-7/2014-19

Datum: 8. 12. 2014

OBČINSKI SVET
OBČINE TREBNJE

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE TREBNJE**

**NASLOV GRADIVA: Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta:
Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku
trebnje**

Gradivo pripravil: Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti
Mateja Zupančič

Pristojno delovno telo: Odbor za / Komisija za

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje*

Alojzija Kastelica:

Darinka Trdina,
višji svetovalec I.

PREDLOG SKLEPA:

S K L E P

I. Občinski svet Občine Trebnje sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje št. 671-7/2014-18.

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Priloge:

- *Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje št. 671-7/2014-18*

Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje

I. NASLOV

Naslov Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se glasi: Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje dokumenta

Občina Trebnje se je 17. 11. 2014 prijavila na javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v letu 2015. Predpogoj za prijavo je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Prvi in temeljni razlog za investicijsko namero je zagotovitev osnovnih pogojev za uresničevanje javnega interes v športu na lokalni ravni, saj prave rekreacijske oz. trim steze v Trebnjem ni. Z ureditvijo in obnovo atletske steze bo zagotovljen razvoj vseh segmentov športa na lokalni ravni, tako športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa kot tudi športa invalidov. Urejeni športni objekti, motivirana športna vzgoja v osnovni šoli, razviti rekreacijski športni duh med člani v društvih, medgeneracijska športna druženja krajanov, lepša podoba kraja zaradi bolj urejene športne infrastrukture ipd., bodo dvignili raven razvitosti športa v obravnavani lokalni skupnosti Krajevne skupnosti Trebnje na višjo raven, ki bo primerljiva z ostalimi lokalnimi skupnosti v Sloveniji.

2. Ocena stanja

Javni interes v športu lahko občani Trebnjega na prostem uresničujejo na sledečih zunanjih športnih površinah:

- nogometno igrišče z umetno travo (1.820 m²),
- asfaltirano košarkarsko igrišče (364 m²)
- zaletišče za skok v daljino z eno progo, pokrito z lešem (zaraščena in nič več v uporabi) in druga, pokrita s tartanom ter z doskočiščem,
- atletska steza, ki je pokrita z lešem (1850 m²).

Vse navedene športne površine se nahajajo pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje in so javna površina, namenjena športu in rekreaciji prebivalcev lokalne skupnosti. Športni park predstavlja edino rekreacijsko površino v mestu Trebnje in je nujno potreben obnove.

V letu 2014 se je uredilo novo nogometno igrišče dimenzij 52m X 35m z vgrajeno umetno travo HAT TRICK. Poleg novega nogometnega igrišča sta bili montirani tudi zaščitni mreži za goli in razsvetljava igrišča in okolice. Glede na to, da Trebnje nima ustreznih tartanskih površin za tek, je potrebno urediti in obnoviti tudi tekaško stezo. Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega parka, asfaltiranje in polaganje tartana pa je potrebno zagotoviti s tem projektom.

3. Pravna podlaga za sprejem dokumenta

Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in NPB1), z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, NPB1, 15/03 - ZOPA in NPB2) ter Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14).

4. Cilji in načela

Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega parka, s tem projektom pa je potrebno zagotoviti asfaltiranje in polaganje tartana po atletski stezi v dolžini 120 m in krožni stezi na 200 m s šestimi stezami (skupaj 1.850 m² površine).

5. Ocena finančnih in drugih posledic

Skupna vrednost investicije znaša 76.173,75 € z DDV, od tega asfalterska dela 33.516,45 € in polaganje tartana 42.657,30 €. S proračunom Občine Trebnje za leto 2015 bodo planirana sredstva v višini 50% vrednosti investicije, torej 38.086,88 EUR, 50 % pa bo v primeru uspešne rešene prijave na razpis sofinancirala Fundacija za šport.

III. BESEDILO DOKUMENTA

1. OBRAVNAVA



OBČINA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE

NAZIV PROJEKTA:

OBNOVA IN UREDITEV ATLETSKE STEZE V ŠPORTNEM PARKU TREBNJE

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Trebnje, november 2014

Župan:
Alojzij Kastelic

PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: *Občina Trebnje*

Naslov: *Goliev trg 5, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba investitorja: *župan Alojzij Kastelic*

Župan:

Trebnje, november 2014

Žig in podpis

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE:

Naziv: *Občina Trebnje*

Naslov: *Goliev trg 5, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba: *župan Alojzij Kastelic*

Župan:

Trebnje, november 2014

Žig in podpis

IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA:

Naziv: *Občina Trebnje*

Naslov: *Goliev trg 11, 8210 Trebnje*

Občinska uprava Občine Trebnje

Izdelovalec:

Trebnje, november 2014

Žig in podpis

PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta	Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje
Investitor / lastnik:	Občina Trebnje
	Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje
	Matična številka: 5882958
	Davčna številka: SI34728317
	E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si
	Tel. št.: (07) 34 81 100
	Fax. št.: (07) 34 81 131
	Župan: Alojzij Kastelic
Naročnik investicijske dokumentacije	Isti kot investitor
Namen investicijskega projekta	Obnoviti atletsko stezo v športnem parku
Lokacija investicije	Občina: Trebnje Naselje: Trebnje Lokacija: Športni park pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje Parcela: 90/1, 91/1, 121/1, k.o. 1422 Trebnje
Projektna dokumentacija	
Investicijska dokumentacija	Dokument identifikacije investicijskega projekta
Terminski plan	april – junij 2015
Vrednost investicije	62.437,50 EUR (brez DDV)
Vir financiranja	Občina Trebnje iz proračuna, sofinanciranje Fundacije za šport
Namen izdelave DIIP	Opredeliti probleme, s katerimi se sooča kraj Trebnje in celotna občina, zaradi pomanjkanja ustrezne atletske steze. Cilj projekta je asfaltiranje in položitev tartana na atletski stezi in s tem pridobitev ustrezne športne površine za razvoj profesionalnega športa, rekreacije, druženja, tekem, ...

KAZALO:

<u>1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB</u>	5
<u>1.1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU</u>	5
<u>1.2 OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKE PROJEKTA</u>	6
<u>1.3 PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE</u>	7
<u>2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO</u>	7
<u>2.1. KARAKTERISTIČNI PODATKI IN SPLOŠNI OPIS OBČINE TREBNJE</u>	8
<u>2.2. OPIS MESTA TREBNJE</u>	9
<u>2.3. PREDMET INVESTICIJE</u>	10
<u>2.4. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V MESTU TREBNJE</u>	10
<u>2.5. RAZLOGI IN UTEMELJITEV INVESTICIJSKE NAMERE</u>	12
<u>3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE</u>	14
<u>4. PREDSTAVITEV VARIANT</u>	15
<u>4.1. VARIANTA »BREZ INVESTICIJE«</u>	15
<u>4.2. VARIANTA »Z INVESTICIJO«</u>	16
<u>5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV</u>	17
<u>5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE</u>	17
<u>5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH</u>	18
<u>6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO</u>	18
<u>6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA</u>	18
<u>6.2. LOKACIJA</u>	19
<u>6.3. NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH</u>	20
<u>6.3.1. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih in stalnih cenah</u>	20
<u>6.3.2. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih in stalnih cenah</u>	20
<u>6.4. VARSTVO OKOLJA</u>	20
<u>6.5. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA</u>	21
<u>7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM</u>	22
<u>8. POVZETEK Z ZAKLJUČNO OCENO</u>	23
<u>9. PRILOGE</u>	27

1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB

1.1 Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.2 Osnovni podatki o izdelovalcu dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba: Janez Pirc, mag. jav. upr.

Izpolnjevalec podatkov: Mateja Zupančič

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.3 Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133


Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: župan Alojzij Kastelic

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Karakteristični podatki in splošni opis Občine Trebnje

Občina Trebnje je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu Slovenije. Obsega 12 krajevnih skupnosti (KS Čatež, KS Dobrnič, KS Dolenja Nemška vas, KS Knežja vas, KS Račje selo, KS Sela pri Šumberku, KS Svetinja, KS Šentlovenec, KS Štefan, KS Trebnje, KS Veliki Gaber in KS Velika Loka) s 133 naselji, med katerimi je upravni center naselje Trebnje. Občina meji na sosednje občine Šmartno pri Litiji, Litija, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Žužemberk in Ivančna Gorica.

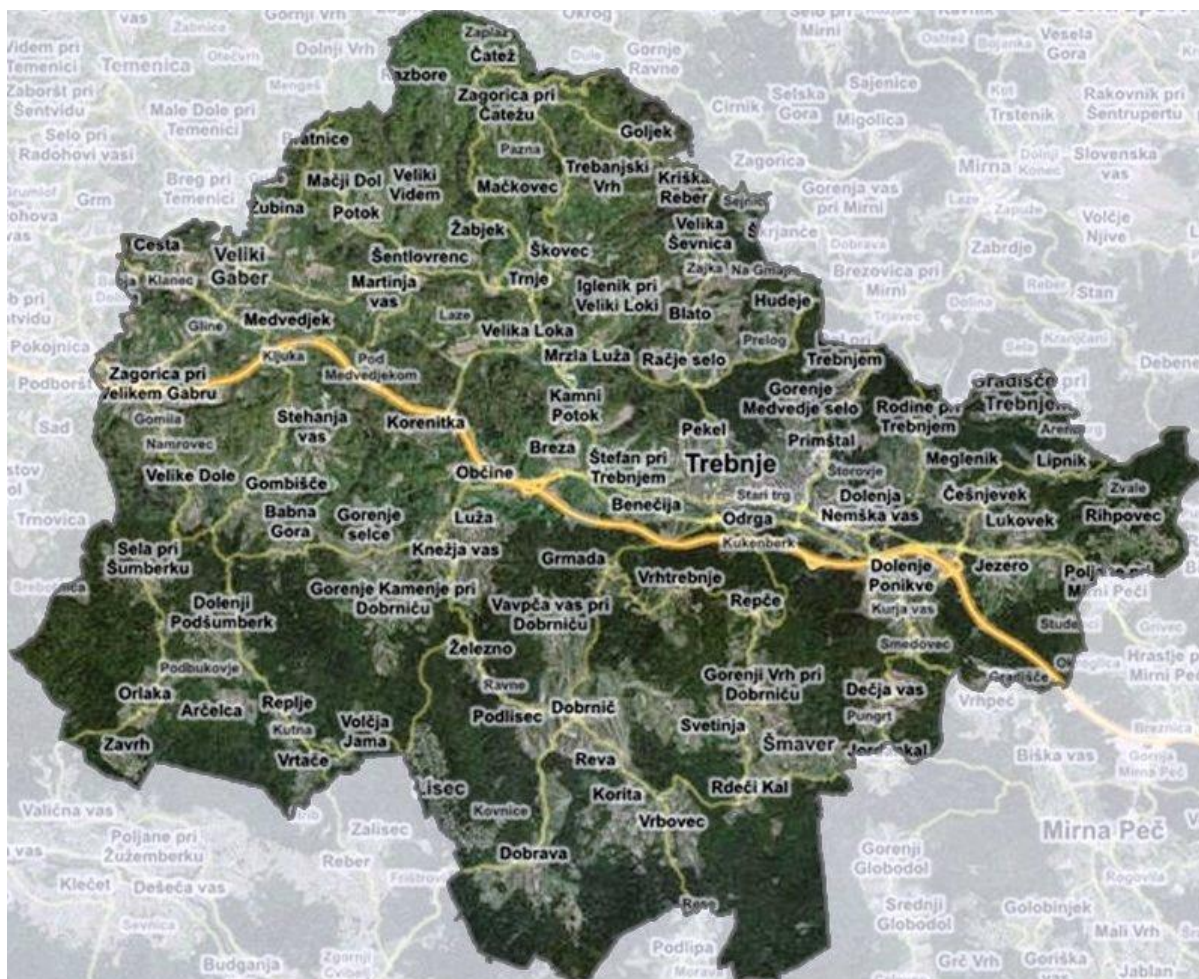

Slika 1: OBČINA TREBNJE.

Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO,
<http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE>, november 2014.

Vrsta podatka	
Datum ustanovitve občine	01.01.1995
Uradni list	60/94 in 56/98
Površina občine	163,3 km ²
Število naselij	133
Število prostorskih okolišev	182
Število hišnih števil	4418
Število ulic	48
Število prebivalcev	12.063
Število krajevnih skupnosti	12
Dolžina lokalnih cest	101,2 km
Dolžina kategoriziranih javnih poti	200,05 km

Tabela 1: KARAKTERISTIČINI PODATKI O OBČINI TREBNJE.

Vir : www.trebnje.si/ in http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji

2.2 Opis mesta Trebnje

Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana - Novo mesto. Staro jedro naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice, novejši del pa se širi severno od železniške proge in stare ceste proti Novemu mestu. V rimskem času je bila tu naselbina Praetorium Latobiorum. V starih listinah se kot podžupnija kraj prvič omenja 1163. Kot trg pa je Trebnje prvič omenjeno leta 1351. Ob koncu 18. stoletja je bilo Trebnje sedež okrajnega komisariata, pozneje tudi političnega, sodnega, davčnega in običajno tudi volilnega okraja, ter pomembna poštna postaja. Na gospodarski napredek sta sicer vplivali dobra prometna lega na križišču cest in 1894 zgrajena Dolenjska železnica in leta 1908 predan v uporabo odsek železniške proge od Trebnjega prek Tržišča do premogovnika Krmelj.

Kljub dobri prometni legi pa se kraj ni razvijal in je ostal vse do konca 2. svetovne vojne manjše gospodarsko središče poljedelske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje postalo središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana – Zagreb, je Trebnje z industrializacijo dobilo številna nova delovna mesta v kovinski, lesnopredelovalni in tekstilni industriji ter industriji gradbenega materiala. Ob lokalni cesti proti Mirni je bila zgrajena tudi ena večjih obrtnih con na Dolenjskem.

Skozi Trebnje poteka 15. poldnevnik, ki je obeležen z veliko tablo ob vhodu v mesto z zahodne strani ter z radijsko vodeno uro, ki kaže točen srednjeevropski čas. Poleg table in ure je tudi informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku. Na razgledni točki nad Vrhtrebnjem pa je zgrajeno tudi kamnito obeležje z bronastim reliefom Slovenije, na katerem so prikazani pomembnejši kraji v Sloveniji, višji vrhovi in potek 15. poldnevnik preko slovenskega ozemlja.

2.3 Predmet investicije

Predmet nameravane in obravnavane investicije v pričujočem investicijskem dokumentu je preureditev in obnova atletske steze v športnem parku v Trebnjem, in sicer:

- asfaltiranje in položitev tartana na atletski stezi v dolžini 120 m in krožni stezi na 200 m s šestimi stezami.

2.4 Pregled in analiza obstoječe športne infrastrukture v mestu Trebnje

Javni interes v športu lahko občani Trebnjega na prostem uresničujejo na sledečih zunanjih športnih površinah:

- nogometno igrišče z umetno travo (1.820 m²),
- asfaltirano košarkarsko igrišče (364 m²)
- zaletišče za skok v daljino z eno progo, pokrito z lešem (zaraščena in nič več v uporabi) in druga, pokrita s tartanom ter z doskočiščem,
- atletska steza, ki je pokrita z lešem (1850 m²).

Vse navedene športne površine se nahajajo pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje in so javna površina, namenjena športu in rekreaciji prebivalcev lokalne skupnosti.

Športni park predstavlja edino rekreacijsko površino v mestu Trebnje in je nujno potreben obnove.

V letu 2014 se je uredilo novo nogometno igrišče dimenzij 52m X 35m z vgrajeno umetno travo HAT TRICK. Poleg novega nogometnega igrišča montirani tudi zaščitni mreži za goli in razsvetljava igrišča in okolice. Glede na to, da Trebnje nima ustreznih tartanskih površin za tek, je potrebno urediti in obnoviti tudi tekaško stezo. Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega parka, asfaltiranje in polaganje tartana pa je potrebno zagotoviti s tem projektom.

Lastnik in upravljavec

Lastnik obravnavanega športnega parka je Občina Trebnje, upravljavec pa Osnovna šola Trebnje.

Uporabniki športnega igrišča

Uporabniki športnega igrišča in atletske steze so otroci in mladina, ki se prostovoljno ukvarja s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, na njem pa se športno rekreirajo tudi odrasli občani vseh starosti in družin. Na omenjenem igrišču in atletski stezi pa se uresničuje tudi zahteva po zagotavljanju kakovostnega

športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Atletsko stezo uporablja tudi Zdravstveni dom Trebnje s podizvajalci za namene ozaveščanja prebivalcev o pomenu rekreacije, vzdrževanja kondicije itd. za zdravje ter Osnovna šola Trebnje za izvajanje športnih aktivnosti pri pouku športne vzgoje.

Športni park pa je hkrati večnamenski in kot tak velikega pomena za nadaljnji razvoj športa v občini.

V Trebnjem deluje več športnih društev in klubov ter ostalih skupin občanov, ki so potencialni uporabniki obnovljene atletske steze.

Ime društva	Naslov	Elektronski naslov
Rokometni klub Trimo Trebnje	Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, p.p. 68	Info@rktrimotrebnje.si
Kegljaški klub Trebnje	Levstikova 14, 8210 Trebnje	niko.goles@gmail.com
Strelsko društvo Trebnje	Praproče 12, 8210 Trebnje	franc.cugelj@gmail.com
AMD Trebnje	Trubarjeva 2, 8210 Trebnje	jani.prosenik@eu
Karate klub Trebnje	Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje	zvone.breznikar@siol.net
Športno društvo Trimko	Tomšičeva 13, 8210 Trebnje	ssdtrebnje@gmail.com
Šolsko športno društvo Trebnje	Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje	sd.trimko@gmail.com
Nogometni klub Trebnje	Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje	nk.trebnje@gmail.com
Golf klub Trebnje	Blato 27, 8210 Trebnje	gcc.trebnje@gmail.com
Društvo tekačev in pohodnikov Trebnje	Rimska cesta 26, 8210 Trebnje	jose.kastelic@gmail.com
UTŽO Trebnje	Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje	info@ciktrebnje.si
Društvo tabornikov Rod sivih jelš Trebnje	Gubčeva cesta 16b, 8210 Trebnje	rsj.trebnje@gmail.com
Športno društvo STEP	Ulica OF 3, 8210 Trebnje	tanja.brodnik@gmail.com
KS Trebnje	Rimska cesta 33, 8210 Trebnje	info@kstrebnje.si
Gasilska zveza Trebnje in PGD Trebnje	Rimska cesta 33, 8210 Trebnje	gasilskazvezatrebnje1@siol.net
Planinsko društvo Trebnje	Mrzla Luža 2a, 8212 Velika Loka	roman.perpar@gmail.com info@pdtrebnje.si
Športna zveza Trebnje, Center za šport občine Trebnje	Goliev trg 6, 8210 Trebnje	dejan.smuk@gmail.com

Tabela 2: ŠPORTNA DRUŠTVA IN KLUBI, KI SO POTENCIALNI UPORABNIKI ATLETSKE STEZE.

Vir: Podatki Občinske uprave Občine Trebnje.

2.5 Razlogi in utemeljitev investicijske namere

Uresničevanje javnega interesa v športu in razvoj športa v Trebnjem

Prvi in temeljni razlog za investicijsko namero je zagotovitev osnovnih pogojev za uresničevanje javnega interesa v športu na lokalni ravni. Z ureditvijo in obnovo atletske steze bo zagotovljen razvoj vseh segmentov športa na lokalni ravni, tako športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa kot tudi športa invalidov.

V Trebnjem sta najbolj prepoznavna in najuspešnejša kluba Rokometni klub Trimo Trebnje in Nogometni klub Trebnje. Za zagotovitev minimalnih pogojev za njun nadaljnji razvoj, na primer za kondicijske treninge, je kvalitetna atletska steza bistvenega pomena.

Slovensko povprečje nepokritih športnih površin na prebivalca na m² znaša 2,87 m², v Trebnjem pa je to povprečje za enkrat le 1,12 m². Še te površine pa so v zelo slabem stanju. Z ureditvijo in obnovitvijo atletske steze se to povprečje sicer ne bi dvignilo, bi pa bilo uporabnikom zagotovljeno primerno in varno izvajanje športnih dejavnosti.

Športno druženje članov društev

V KS Trebnje je veliko društev, ki s pridom uporabljajo obravnavane športne površine in s tem tekaško stezo. Uporabljajo jih za šport in rekreacijo svojih članov. Organizirajo pa tudi razna tekmovanja, dobrodelne teke in meddruštvena srečanja. In tudi v tem primeru bi bila to dobra promocijo kraja z vidika meddruštvenega druženja na urejenih športnih površinah.

Splošni pomen za kraj

Urejeni športni objekti, motivirana športna vzgoja v osnovni šoli, razviti rekreacijski športni duh med člani v društvih, medgeneracijska športna druženja krajanov, lepša podoba kraja zaradi bolj urejene športne infrastrukture ipd., bodo dvignili raven razvitosti športa v obravnavani lokalni skupnosti Krajevne skupnosti Trebnje na višjo raven, ki bo primerljiva z ostalimi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji.

Izvajanje šolske športne vzgoje

Iz predhodnega podpoglavja izhaja, da je uporabnik športnega igrišča v Trebnjem tudi Osnovna šola Trebnje. V okviru osnovno šolskega programa se izvajajo športne aktivnosti pri pouku športne vzgoje, od katerih sta pomembni aktivnosti tudi tek in pohodništvo. Nekatere športne aktivnosti se lahko izvajajo na primerljivi kakovostni ravni enako starostnih skupin učencev v primerjavi z ostalimi v Sloveniji, nekatere športne panoge, kot je tek na krožni tekaški progi pa ne. Učenci se danes teh atletskih panog učijo na delno urejeni atletski stezi in na travnatih površinah, kar vsekakor ne omogoča pravilne izvedbe športnih tehnik in tako posledično na tekmovanjih ne dosegajo primerljivih rezultatov, oziroma se težje uvrstijo na regijska in državna tekmovanja. Tek na urejeni atletski stezi z ustrezno podlago in neprestana vadba s pravilnim startom in iztekom ob zaključku atletske steze, omogoča primerljive rezultate med enako starostno skupino učencev z drugimi v državi.

Pridobitev urejene atletske steze z ustrezno podlago je torej neprecenljiva za šolsko vadbo, pa tudi boljša priložnost in motivacija za iskanje talentov v atletiki. S stališča šole je pomembno, da se izboljša kvaliteta športnih površin, saj mladi iz obravnavanega lokalnega okolja v 21. stoletju morajo imeti enake možnosti, kot njihovi sovrstniki po Sloveniji. Hkrati pa bi to bila tudi dobra promocijo kraja z vidika večjih atletskega tekmovanj s stališča osnovnošolskih otrok. Vse to danes ob takih tekaških pogojih ni možno.

Mnenje Športne zveze občin Trebnje in Mirna

»Ureditev atletske steze s tartanom v športnem parku pri CIK (in tudi drugih športnih objektov) je resnično nujna, saj bo omogočila boljše vadbo tako šolskim kot predšolskim otrokom. Številni naši meščani, predvsem starejše generacije, dnevno uporabljajo to atletske stezo za rekreacijske sprehode, saj prave rekreacijske oz trim steze v Trebnjem nimamo. Kljub zelo slabemu stanju te steze in neuporabnosti le te po deževnem obdobju, jo dnevno uporabljajo tudi številni tekači rekreativci.

Športna zveza občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM) je kot krovna organizacija vseh športnih klubov teh dveh občin, marca 2013 izdelala idejni osnutek ureditve tega športnega parka in v njem upoštevala želje in ideje vseh 16 športnih klubov, članov naše Športne zveze. Atletska steza ni edini športni objekt, katerega obnove se moramo lotiti, je pa zagotovo zelo pomemben.« (Dejan Smuk, predsednik ŠZ TIM)

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicije je zagotoviti uporabnikom športnih površin v krajevni skupnosti Trebnje primerno in varno rabo atletske steze.

Vpliv na razvojne možnosti je pozitiven predvsem s športnega vidika, saj bo z obnovo in ureditvijo atletske steze narejena posodobitev športnega parka ter storjen še en korak naprej k popolni ureditvi športnega parka v Trebnjem. Poleg tega bodo izboljšani pogoji za športno rekreacijo, predvsem hojo in tek. Omogočeno bo kvalitetno izvajanje športa v osnovni šoli s tem pa se bodo povečale možnosti za razvoj kvalitetnega športa, ter konec koncev tudi vrhunškega športa. Pričakuje se, da bodo urejene tekaške površine povečale delež športno dejavnih prebivalcev in s tem pripomogle k bolj zdravemu načinu življenja. Hkrati se bo povečala prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema, ne samo v Trebnjem temveč v celotni občini in širše.

Cilj investicije je urediti in obnoviti atletske stezo v športnem parku pri Centru za vzgojo in izobraževanje Trebnje v skupni izmeri 1850 m². Atletska steza bo asfaltirana in prevlečena s tartanom.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča:

NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA ZA OBDOBJE 2014-2023

Investicija je skladna z osnutkom Nacionalnega programa športa 2014-2023, v katerem je med drugim zapisano, da je cilj programa tudi »povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije«¹, kar bo z primerno in varno urejeno atletske stezo v veliki meri doseženo, saj se bo s tem povečal tako delež mlajših, odraslih in starejših tako tekačev kot pohodnikov. Na področju z Nacionalnim programom športa predpisanih ukrepov se bo ohranjalo število športnikov z državnim razredom ter število vrhunskih športnikov, število osvojenih medalj na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, ter pripomoglo k vsestranskemu razvoju vrhunskih športnikov v času njihove športne kariere in po njej, ker jim bo z ureditvijo atletske steze omogočeno ustrezno izvajanje kondicijskih treningov in drugih športnih dejavnosti.

Z ravno površino atletske steze bodo vzpostavljeni pogoji, da bodo stezo lahko uporabljali tudi invalidi, s tem pa bo zadoščen cilj razvoja športa invalidov na lokalni ravni.

Z investicijo bo nadalje zadoščeno cilju Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji po zagotavljanju posodabljanja športnih objektov in naravnih površin za šport po načelih trajnostnega razvoja.

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2014

Investicija je skladna tudi z cilji in načeli Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2014. Zadnji opredeljeni cilj v letnem programu je načrtovati gradnjo in vzdrževanje športnih objektov, kar bi delno uresničili tudi z obnovo in ureditvijo atletske steze v športnem parku pri Centru za izobraževanje in kulturo. Poleg omenjenega, pa bi zadostili tudi cilju ohranjanja, in celo zvišanja, dosedanje ravni števila občanov, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

¹<file:///C:/Documents%20and%20Settings/matejaz/My%20Documents/Downloads/VladnogradivoNPS210.pdf>

SMERNICE RAZVOJA, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN DELOVNI NAČRT ŠPORTNE ZVEZE OBČIN TREBNJE IN MIRNA 2013-2020

Načrtovana investicija pa je skladna tudi s Smernicami razvoja, programskimi izhodišči in delovnim načrtom Športne zveze občin Trebnje in Mirna 2013-2020.

4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1 Varianta »brez investicije«

V primeru, da se investicija ne bo izvedla, bo športni park v Trebnjem ostal v dosedanjem stanju, kar pomeni, da prebivalci še naprej ne bodo imeli primernih in varnih površin za tek in podobno rekreacijo. Ker se ne bo izvedla naslednja faza preureditve in posodobitve športnega parka, bo cilj o popolni ureditvi parka okrnjen in ostal nedosegljiv.

Kvalitetno izvajanje športa v osnovni šoli bo še naprej ovirano in možnosti za razvoj športne rekreacije, kvalitetnega športa in vrhunskega športa se ne bodo dvignile. Delež športno dejavnih prebivalcev se ne bo povečal, temveč bo ostal enak ali se celo znižal, s čimer se bo neposredno prispevalo k slabšemu zdravstvenemu stanju prebivalcev v kraju.

Pravo tako bi se slabše razvijalo športno – rekreacijska dejavnost članov društev, upokojencev in ostalih uporabnikov atletske steze. Naslednje negativne posledice variante »brez investicije« pa bi bile še:

- stroški vzdrževanja obstoječe atletske steze bi se iz leta v leto povečevali,
- zmanjševala bi se podoba kraja in dodana vrednost urejenega športnega parka,
- ne bi bilo sledenja trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- zmanjšala se bi rast športne kulture in ozaveščenosti krajanov Krajevne skupnosti Trebnje,
- število športno aktivnih prebivalcev krajevne skupnosti bi se začelo zmanjševati,
- športno – rekreativni programi za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti bi se zmanjševali,
- športno zdravstveno-preventivni programi in športni programi za krepitev zdravja se v prihodnosti nebi razvijali,
- izvajalci športno rekreativnih programov bi bili demotivirani za izvedbo le-teh.

Iz vseh zgoraj podanih negativnih posledic variante »brez investicije« izhaja samo ena ugotovitev, da ta varianta ni sprejemljiva.

4.2 Varianta »z investicijo«

Obnova in preureditev atletske steze na sledeč način:

ASFALTERSKA DELA	27.472,50 €
POLAGANJE TARTANA	34.965,00 €
Skupaj:	62.437,50 €
DDV 22%:	13.736,25 €
Skupaj z DDV:	76.173,75 €

Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega parka, s tem projektom pa je potrebno zagotoviti asfaltiranje atletske steze in polaganje tartana po le-tej.

Pri asfaltiranju atletske steze je v ocenjeno vrednost zajeto:

Dobava in vgrajevanje dvoplastnega drenažnega asfalta A4 + A5 v debelini 3 + 4cm skladno s TSG06-300 410-2009, vključno z vsemi meritvami, dokazili in obveznimi kontrolami naklonov. Pred začetkom del je potrebno recepturo asfalta in eventualna odstopanja od Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih zmesi za športne objekte uskladiti z izvajalcem sintetične podlage. V ceni je potrebno upoštevati postavitev opaža za kasnejšo zapolnitev fuge z sintetično maso

Pri polaganju tartana na atletsko stezo je v ocenjeno vrednost zajeto:

Izdelava sintetične prevleke:

-nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat debeline cca 10 mm

-zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav debeline cca 3 mm

Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana in prevzeta. V ceni zajeto tudi liniranje tekaške steze. Dobavljen material mora imeti certifikat IAAF in standard EN.



Slika 2: Idejni osnutek ureditve športnega parka (Športna zveza Trebnje in Mirna). Marec 2013.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1 Opredelitev vrste investicije

a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Investicija v nakup

Adaptacija

Novogradnja

Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

Rekonstrukcija

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

Če je podano državno poročilo ali če je vključeno v nacionalni program

b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta	Identifikacija Investicijskega Projekta	Predinvesticijska zasnova	Investicijski program
manj od 300.000 EUR	Ne, razen Da	Ne	Ne
<ul style="list-style-type: none">• če je objekt tehnološko zahteven• če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in• če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi	Da Da	Ne Ne	Ne Ne
več od 300.000 in manj od 500.000 EUR	Da	Ne	Ne
več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR	Da	Ne	Da
več od 2.500.000 EUR	Da	Da	Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PREDINVESTICIJSKO ZASNOVO

INVESTICIJSKI PROGRAM

5.2 Ocena investicijske naložbe po stalnih cenah

Vrednost stroškov investicije je bila izdelana na naslednjih osnovah:

1. Priporočil Fitolab športnega inženiringa d.o.o., raziskav trga strokovnih delavcev Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti ter ocen vodje Oddelka za Okolje in prostor.

Tabela 3: Vrednost investicije po postavkah v stalnih cenah (v EUR)

Ocena stroškov po stalnih cenah v časovnem načrtu	2015	Skupaj
Obnova atletske steze		62.437,50
asfaltiranje	27.472,50	27.472,50
polaganje tartana	34.965,00	34.965,00
Skupaj brez DDV%	62.437,50	62.437,50
DDV%	13.736,25	13.736,25
Skupaj z DDV%	76.173,75	76.173,75

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1 Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji dokumenti:

Zakonska podlaga:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010,
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, NPB1, 15/03 - ZOPA in NPB2),
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

- Idejni predlog OŠ Trebnje za ureditev celotnega športnega parka št. 671-2/2014/2 z dne 1. 4. 2014
- Idejni osnutek ureditev športnega parka avtorja Športna zveza Občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM).

6.2 Lokacija


Investicija se bo izvedla v Občini Trebnje, v naselju Trebnje. Nepremičnina, na kateri je predvidena obnova atletske steze, se nahaja v centru Trebnjega na zemljišču s parcelno št. 231/2, k.o. 1422-Trebnje.

Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013).

Slika 2: Parcelne številke 90/1, 91/1, 121/1, k.o. Trebnje



Slika 3: Lastništvo parc. št. 90/1, 91/1, 121/1, k.o. Trebnje

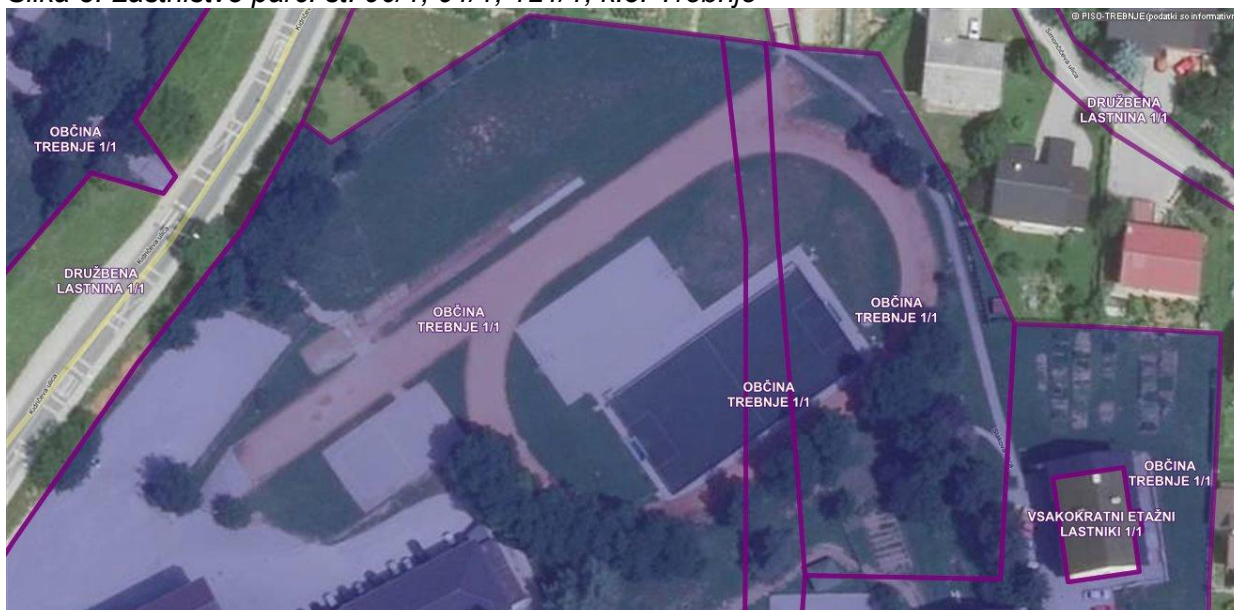

Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO,
<http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE>, november 2014.

6.3 NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH CENAH

6.3.1 Načrt financiranja po virih financiranja v stalnih cenah

Celotno investicijsko naložbo bo financirala Občina Trebnje iz proračuna v višini 50% ter v višini 50% sofinancirala Fundacija za šport.

Tabela 4: Viri financiranja stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

LETO	2015	DELEŽ	SKUPAJ:
PRORAČUN OBČINE TREBNJE	31.218,75 EUR	50 %	31.218,75 EUR
FUNDACIJA ZA ŠPORT	31.218,75 EUR	50 %	31.218,75 EUR
SKUPAJ BREZ DDV:	62.437,50 EUR	100 %	62.437,50 EUR
SKUPAJ Z DDV	76.173,75 EUR	100 %	76.173,75 EUR

6.3.2 Načrt financiranja po dinamiki v stalnih cenah

Tabela 5: Dinamika financiranja vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

LETO	Stalne cene v EUR	Delež
2015	76.173,75 EUR	100 %
Skupaj:	76.173,75 EUR	100 %

6.4 Varstvo okolja

Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Pri izvedbi obravnavane investicije bodo uporabljene najsodobnejše tehnike, ki bodo pri sami izvedbi zmanjšale količine odpadkov, emisij in ostalih tveganj onesnaževanja. Ocenjujemo, da bo po končanju obnove atletske steze in njeno delovanje v prihodnosti, nevtravno obremenjevalo okolje. Manjše obremenitve s hrupom in prahom se bodo pojavile le v času gradbenih del, ki jih pa bo izvajalec zmanjšal na minimum.

6.5 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti in ekonomska in družbena upravičenost investicije

V kolikor se izvede obnova in preureditev atletske steze se pričakuje, da bo v uporabi vsaj toliko kot do sedaj. Menimo, da jo bo za svoje rekreacijske sprehode uporabljalo še večje število meščanov, predvsem starejše generacije, še večje število tekačev rekreativcev in tudi osnovna šola ter vrtec.

Glavni rezultat obravnavane investicije je obnovljena atletska steza. Posredni bistveni rezultati pa so še:

- višja ozaveščenost krajanov Krajevne skupnosti Trebnje glede športne kulture in povečanje števila športno aktivnih prebivalcev,
- višja kvaliteta in dodano vrednost prostora ter polepšana podoba kraja,
- kvalitetnejša izvedba športne vzgoje ter testiranje osnovnošolcev Osnovne šole Trebnje,

Iz zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov obravnavane investicije smo torej mnenja, da je predlagana investicija ekonomsko in družbeno upravičena.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
 - a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
 - b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
 - c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 386.000,00 €. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah med 300.000,00 in 500.000,00 €, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt **izdelati najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**.

Za potrebe izvedbe celotne investicije je treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija : DIIP.

Časovni načrt priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije

Aktivnost	2014
Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta	november

Tabela 6: Okvirni terminski plan izdelave investicijske in ostale dokumentacije

Časovni načrt izvedbe:

Občina predvideva, da bo naložbo realizirala v letu 2015, in sicer od aprila 2015 do konca junija 2015.

8. POVZETEK Z ZAKLJUČNO OCENO

Glede na dejstva, da :

- da mesto Trebnje ne razpolaga niti z eno samo atletsko stezo iz tartana, ki bi prebivalcem omogočala ustrezno in varno športno rekreacijo oziroma tek in hojo,
- je atletika osnova vsem športom za splošni del kondicijskih priprav,
- med Ljubljano in Novim mestom ni primerno urejene atletske steze in sta najbližji iz Trebnjega v Novem mestu (24 km) in Ljubljani (54 km),
- da je ta investicija za razvoj športa v mestu Trebnje in širše nujno potrebna,

menimo, da je investicija utemeljena.

9. PRILOGE:

1. **Priporočilo o nujnosti obnove atletske steze v Trebnjem za širšo regijo** Športne zveze občin Trebnje in Mirna, prejeto dne 14. 11. 2014
2. **Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem** Krajevne skupnosti Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014
3. **Priporočilo o obnovi atletske steze v Trebnjem** Društva tekačev in pohodnikov Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014
4. **Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem** Rokometnega kluba Trimo Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014
5. **Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem** Športnega društva Trimko Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014
6. **Priporočilo o nujnosti obnove in ureditve atletske steze v Trebnjem** Šolskega športnega društva Trebnje, prejeto dne 13. 11. 2014
7. **Izjava** o naknadnem posredovanju sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje o potrditvi Dokumenta investicijskega projekta Obnova in ureditev atletske steze v Trebnjem

**IZJAVA o naknadnem posredovanju sklepa Občinskega sveta Občine
Trebnje o potrditvi Dokumenta investicijskega projekta Obnova in
ureditev atletske steze v Trebnjem**

S to izjavo Občina Trebnje zagotavlja, da bo Dokument identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v Športnem parku v Trebnjem v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Trebnje predložen na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje. Fundaciji za šport pa bo sklep o potrditvi posredovan naknadno, takoj ko bo sklep izdan.

župan
Alojzij Kastelic

Žig in podpis

Alojzij Kastelic
ŽUPAN
OBČINE TREBNJE

IV. OBRAZLOŽITEV

Mesto Trebnje ne razpolaga niti z eno samo atletsko stezo iz tartana, in tudi med Ljubljano in Novim mestom ni primerno urejene atletske steze (najbližji iz Trebnjega sta v Novem mestu (24 km) in Ljubljani (54 km)). Prebivalcem ni omogočena ustrežna in varna športna rekreacija oziroma tek in hoja, športniki ne morejo kvalitetno izvajati splošnega dela kondicijskih priprav. Iz navedenega sledi, da je ta investicija za razvoj športa v mestu Trebnje in širše nujno potrebna.

Ožje je s to investicijo namen zagotoviti asfaltiranje atletske steze in polaganje tartana po le-tej (pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega parka).

Pri asfaltiranju atletske steze je v ocenjeno vrednost zajeto:

Dobava in vgrajevanje dvoplastnega drenažnega asfalta A4 + A5 v debelini 3 + 4cm skladno s TSG06-300 410-2009, vključno z vsemi meritvami, dokazili in obveznimi kontrolami naklonov. Pred začetkom del je potrebno recepturo asfalta in eventualna odstopanja od Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih zmesi za športne objekte uskladiti z izvajalcem sintetične podlage. V ceni je potrebno upoštevati postavitev opaža za kasnejšo zapolnitev fuge z sintetično maso

Pri polaganju tartana na atletsko stezo je v ocenjeno vrednost zajeto:

Izdelava sintetične prevleke:

-nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat debeline cca 10 mm

-zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav debeline cca 3 mm

Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana in prevzeta. V ceni zajeto tudi liniranje tekaške steze. Dobljen material mora imeti certifikat IAAF in standard EN.

Ocenjene vrednosti so bile izračunane na podlagi priporočil Fitolab športnega inženiringa d.o.o.

Ocena investicijske naložbe po postavkah v stalnih cenah (v EUR)

Ocena stroškov po stalnih cenah v časovnem načrtu	2015	Skupaj
Obnova atletske steze		62.437,50
asfaltiranje	27.472,50	27.472,50
polaganje tartana	34.965,00	34.965,00
Skupaj brez DDV%	62.437,50	62.437,50
DDV%	13.736,25	13.736,25
Skupaj z DDV%	76.173,75	76.173,75

Načrt financiranja po virih financiranja v stalnih cenah (v EUR)

LETO	2015	DELEŽ	SKUPAJ:
PRORAČUN OBČINE TREBNJE	31.218,75 EUR	50 %	31.218,75 EUR
FUNDACIJA ZA ŠPORT	31.218,75 EUR	50 %	31.218,75 EUR
SKUPAJ BREZ DDV:	62.437,50 EUR	100 %	62.437,50 EUR
SKUPAJ Z DDV	76.173,75 EUR	100 %	76.173,75 EUR

Časovni načrt izvedbe:

Občina predvideva, da bo naložbo realizirala v letu 2015, in sicer od aprila 2015 do konca junija 2015.
